

第1回 砂川市立小中学校統合準備委員会 次第

日 時 令和3年6月1日（火） 18:00～

場 所 砂川市役所 2階大会議室

1. 開 会
2. 委嘱書交付
3. 挨拶 砂川市教育委員会教育長
4. 会長及び副会長の選出
5. 説明事項
 - ・これまでの経過について
 - ・小中学校統合準備委員会について
 - ・小中学校統合の流れについて
 - ・検討事項及び協議予定時期について
6. その他
7. 閉 会

別添資料

- 別添1 統合準備委員会 委員名簿
- 別添2 砂川市立小中学校統合準備委員会設置要綱
- 別添3 砂川市立小中学校適正配置基本方針
- 別添4 砂川市立小中学校適正配置基本計画
- 別添5 砂川市立小中学校適正配置基本方針・基本計画【概要版】

これまでの経過について

教育委員会では、市内の児童生徒数が年々減少し、学校規模も大きく変化する中、将来にわたり効果的な統一性のある教育活動を維持するため、平成30年度から市立小中学校の適正規模・適正配置の検討を開始しています。

検討にあたっては、今後の小中学校のあり方や基本的な考え方について、広くご意見をお伺いすることが望ましいとして、市内の関係する各種団体・組織の皆様に対しまして適正配置に係わる「意見を聴く会」を開催し、皆様のご意見を踏まえながら、パブリックコメントを経て、適正配置に係わる基本方針を令和元年6月に策定いたしました。

令和元年8月、基本計画（案）の協議・検討を進めるため、市内関係団体からの推薦により構成される検討委員会を設置し議論を重ねていただき、令和元年12月に検討委員会より計画案となる提言書がまとめられました。

教育委員会では、それまで検討委員会で整理いただいた内容を尊重しながら精査を進め、令和2年5月に「砂川市立小中学校適正配置基本計画」を策定いたしました。

その後、計画の内容について保護者、地域の方々に対して広く周知させていただくため、令和2年10月から11月にかけて11か所の会場で説明会を開催するとともに、令和3年1月から4月にかけて各小中学校PTAに対して基本計画の推進について合意形成をはかりました。

主な取り組みの経過


平成30年4月	適正配置の検討開始
平成30年10月	適正配置に関わる「意見を聴く会」を実施 ・11団体・12開催
令和元年5月	砂川市立小中学校適正配置基本方針（案）に対するパブリックコメントの実施
令和元年6月	「砂川市立小中学校適正配置基本方針」を策定
令和元年8月	砂川市立小中学校適正配置計画検討委員会を設置
令和元年12月	「砂川市立小中学校適正配置計画策定に関する提言書（計画案）」を受理
令和2年5月	「砂川市立小中学校適正配置基本計画」を策定
令和2年10月～11月	「砂川市立小中学校適正規模・適正配置説明会」を保護者、地域向けに学校、コミュニティセンター等11ヶ所で開催
令和3年1月～4月	「砂川市立小中学校適正配置基本計画に対する同意書」による合意形成

小中学校統合準備委員会について

砂川市立小中学校統合準備委員会（以下「準備委員会」という。）は、学校統合を進めていくため、令和2年度に策定した「砂川市立小中学校適正配置基本計画」（以下「基本計画」という。）に沿って具体的な事項を調査及び協議していくために、保護者、地域の方々、学校関係者などからご意見を伺うための機関としており、準備委員会で協議した内容及び決定した事項を取りまとめ教育委員会へ報告（提言）することとしています。

また、基本計画で示している「小中一貫教育の推進」については、別途「砂川市小中一貫教育推進委員会」を設置して協議することとしています。

準備委員会の位置づけ

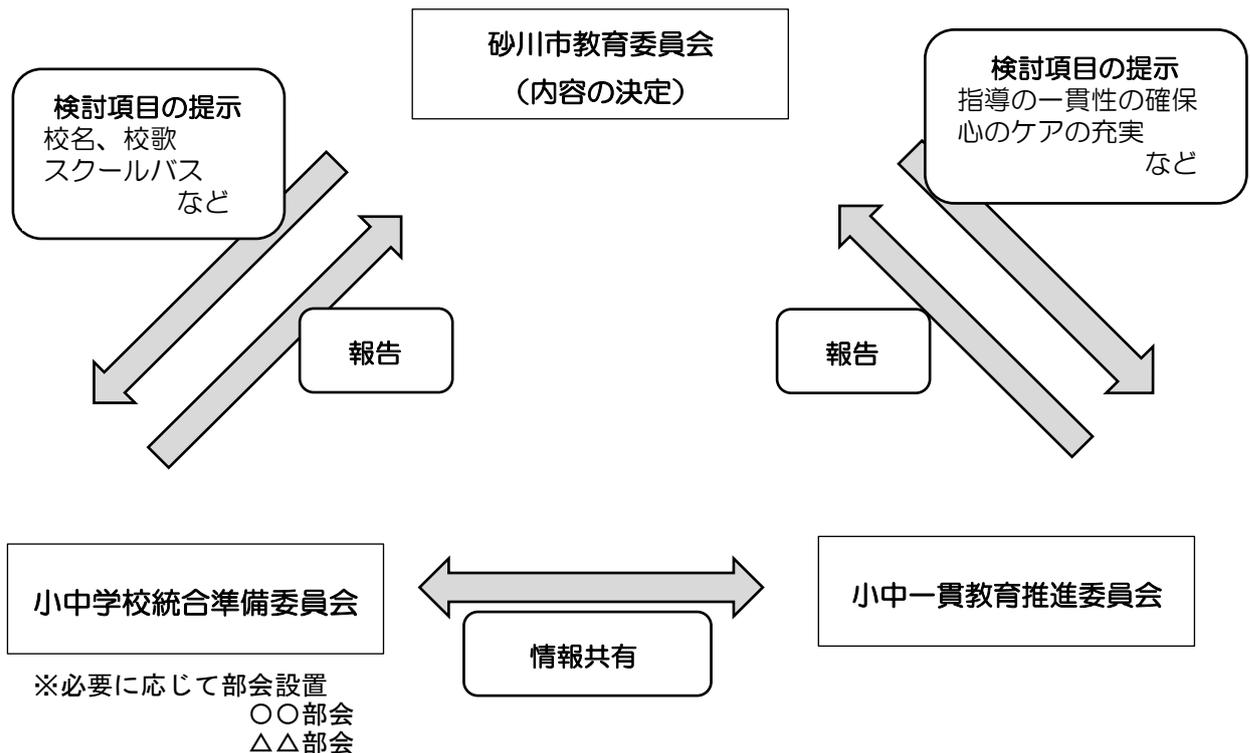


小中学校統合の流れについて

適正配置基本計画では、「小学校5校を1校に統合し、校舎については新校舎を基本とする」「中学校両校を1校に統合し、砂川中学校の活用を基本とする」が基本計画となっており、小学校の統合が令和9～11年度、中学校の統合が令和6～7年度を目指すこととしています。

ただし、保護者や地域等の皆様のご理解により、早期に協議・諸条件等が整った場合は、実施時期を早めることも検討することとしています。

小学校と中学校の統合年度が異なることから、はじめに中学校の統合について協議し進捗状況を鑑みながら小学校統合の協議をはじめます。

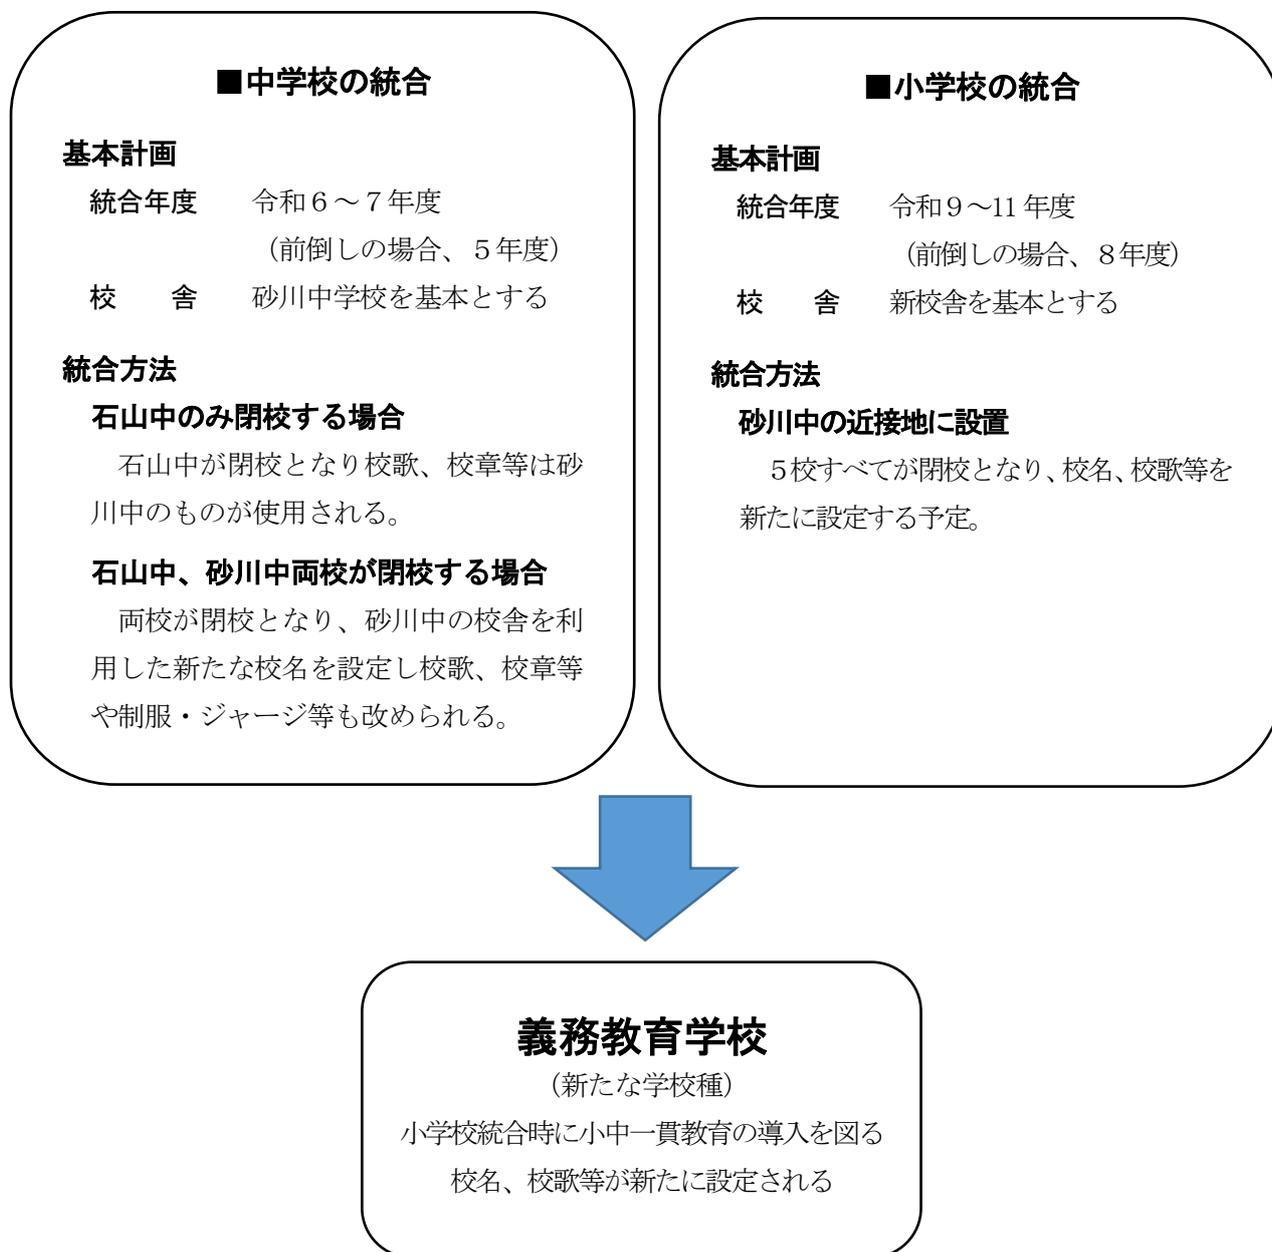

検討事項及び協議予定時期について(案)

【統合準備委員会での検討事項】

区 分	協議予定時期
学校生活に関する事項	
①校名、校章、校旗、校歌、校則、校訓等の決定に向けた調整	7月～10月
②制服、ジャージ、その他指定学用品の調整	7月～8月
スクールバスに関する事項	
①乗車対象者の確定	7月～12月
②スクールバスの運行台数について	
③運行ルート及び停留所について	
④運行回数・休日運行の検討	
⑤登下校時以外のバスの活用について	
⑥業者委託の検討	
⑦委託業者の決定・運行準備	7月～12月

【学校及び教育委員会での検討事項】

区 分	協議予定時期
学校の歴史、記録、会計に関する事項	
①学校史の編さん	6月～10月 (内容確認・協議)
②廃校となる学校の歴史に関わり保存展示すべきものの選定・保存方針の決定(校旗・校章、校名板、校歌、児童生徒の制作物、各種寄贈物、賞状・トロフィー等)	
③同窓会名簿等の整理・統合方針の決定	10月～12月
④PTA会計などの整理・引継ぎ	
⑤記念式典(開校式・閉校式)の準備、実施	
会議、委員等に関する事項	
①PTA規約の改訂、役員等の再選出	令和4年度
②統合後の学校運営協議会や学校関係者評価、学校評議員等のメンバーの調整	
③学校医や学校歯科医等の配置に関する調整、各種非常勤職員の任用の調整	
児童生徒にとっての環境変化への対応	
①学校行事や部活動等において児童生徒同士の交流	12月～3月 (実施内容の調整)
②統合前から在籍している教員を統合後の学校にも一定数配置するとともに、統合後の学級編制や担任の決定について十分な配慮を行う	令和4年度
③教職員のニーズを十分に踏まえ、統合後の指導に必要な研修を実施	適宜
④学習規律や生活規律等に関するルール、生徒指導の方針・基準等についての調整	令和4年度
⑤児童生徒や保護者の不安や悩みを把握するアンケートを継続的に実施	適宜
建設・改修に関すること	
①中学統合に伴う既存中学校の改修等について検証	7月～10月
②小学校又は義務教育学校建設に伴う資産比較	7月～10月
③基本構想の業務委託	9月～12月
その他	
①必要となる条例、規則の改正	令和3年度以降
②廃校となる校舎・校地の跡地利用の検討(市長部局)	令和4年度以降
③適宜、保護者への進捗状況等の説明・確認	適宜
